




BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat
Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme

Progress Minggu Ke - 18



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme
Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tahun 2026

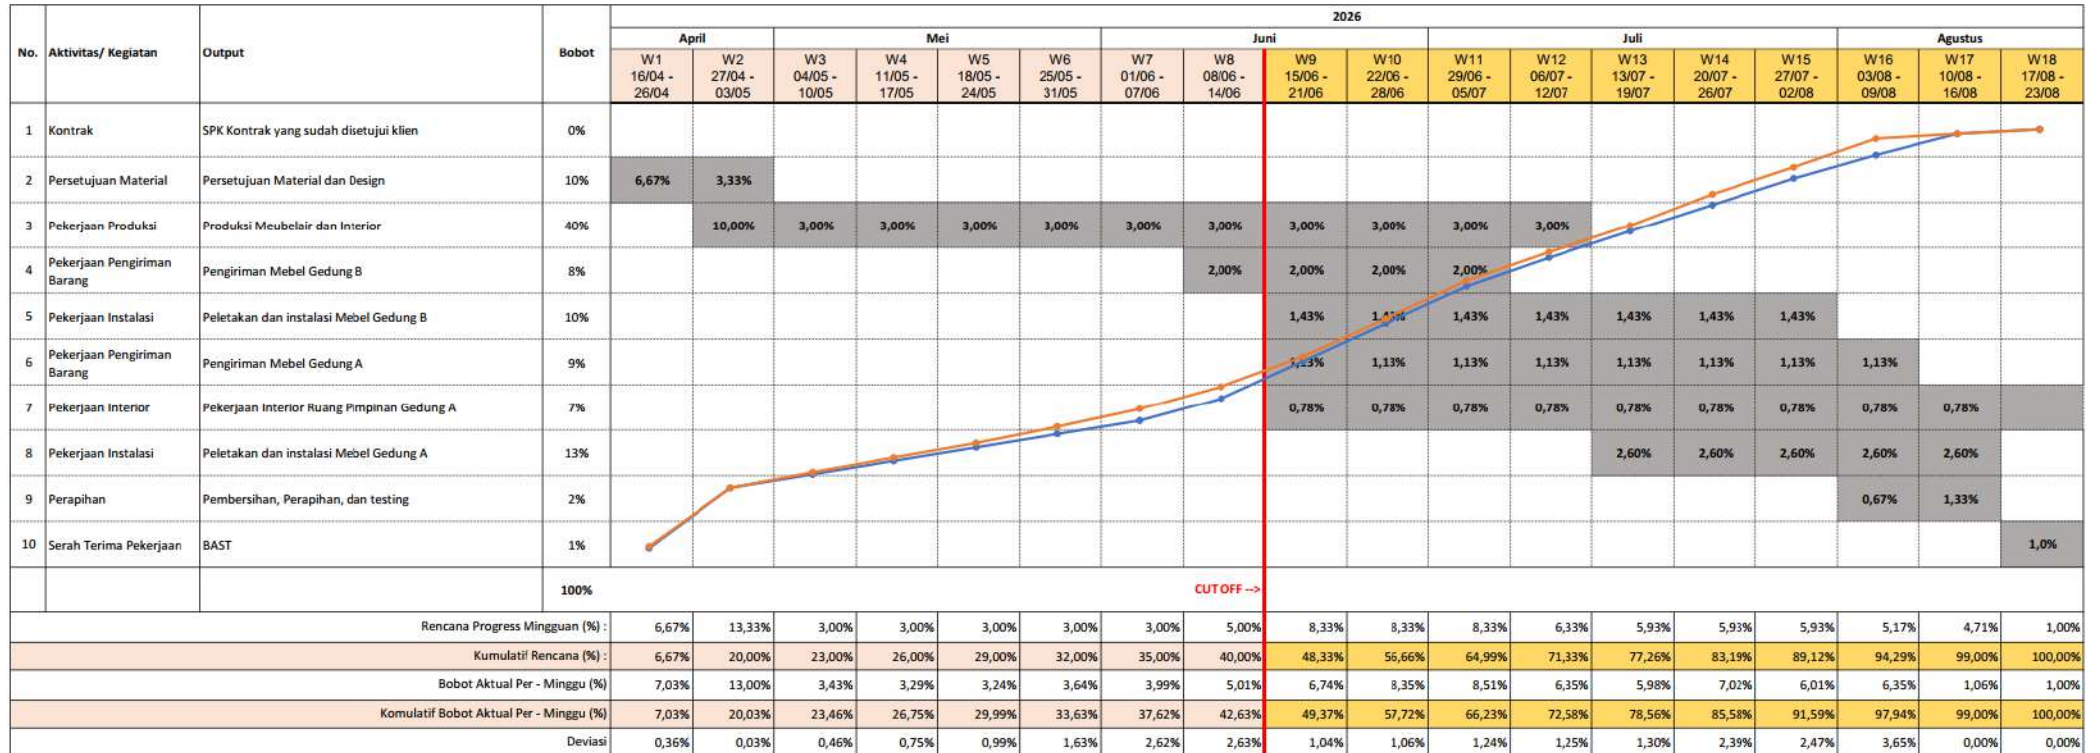

Rangkuman Minggu Ke - 18 (17/08/26 – 23/08/26)

Progress TARGET Lapangan Per Minggu ke -17 : 100,00 %
Progress AKTUAL Lapangan Per Minggu ke -17 : 100,00 %
Deviasi Dari RENCANA KERJA : +0,00 %



LANTAI 4 RUANG KEPALA (Progress 100%)



LANTAI 2 RUANG SESTAMA (Progress 100%)



LANTAI 3 RUANG DEPUTI 1 (Progress 100%)

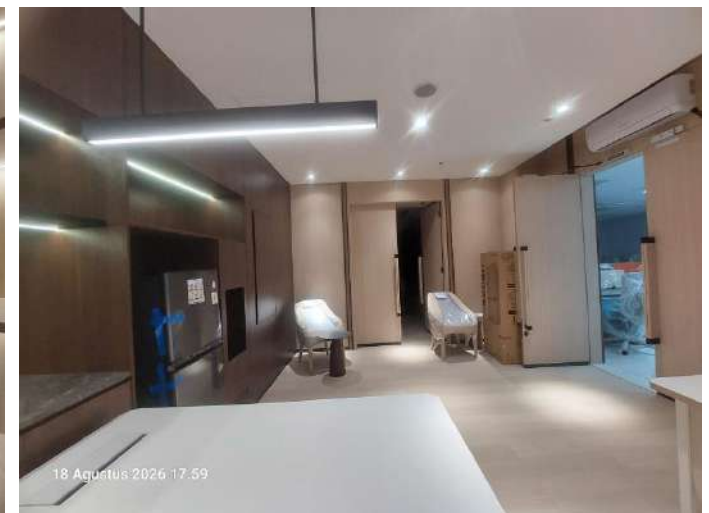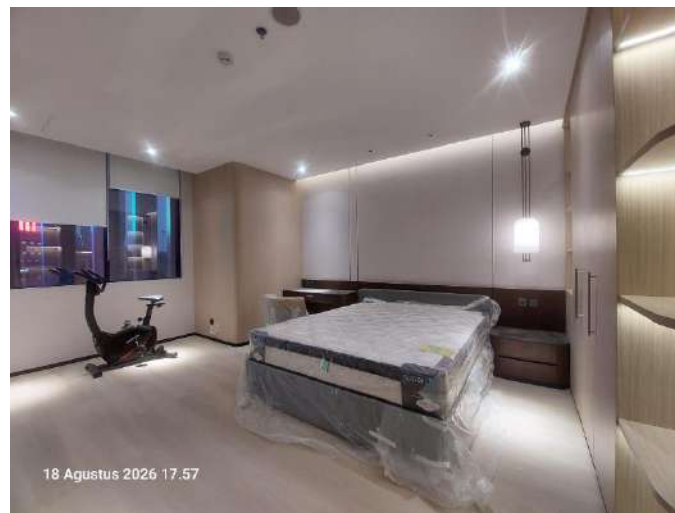

LANTAI 3 RUANG DEPUTI 2 (Progress 100%)



LANTAI 3 RUANG DEPUTI 3 (Progress 100%)




LANTAI 2 RUANG DEPUTI 4 (Progress 100%)




Pekerjaan meubeler (Progres 100%)



Pekerjaan meubeler (Progres 100%)

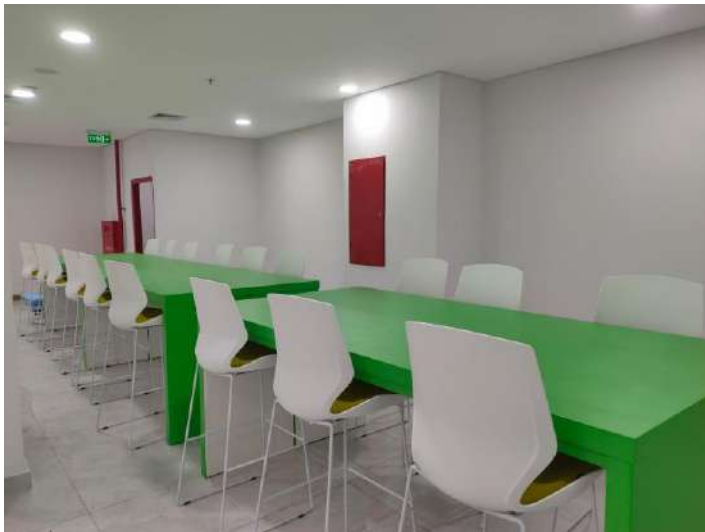

Pekerjaan meubeler (Progres 100%)

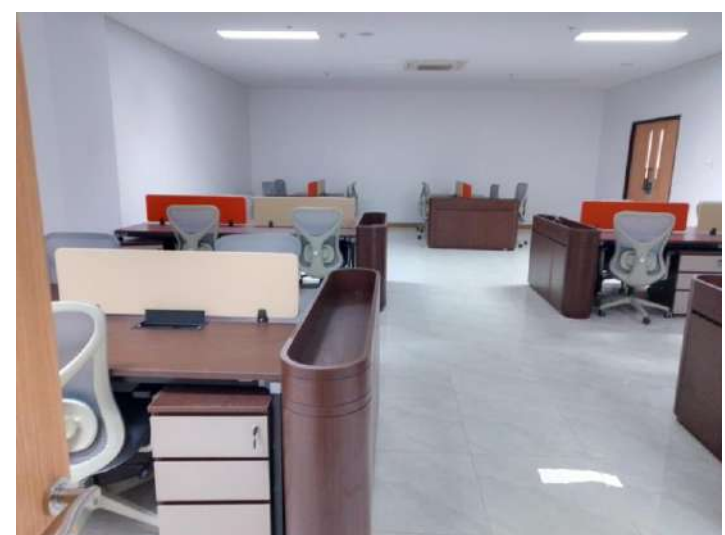



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

TERIMA KASIH
